


# 龙口镇镇消防站建设项目设计答疑

1. 问：两个门柱是结构规格都是 500\*500 吗？石材装饰完成面全部是 800\*800 吗？干挂石材龙骨的详细配置？

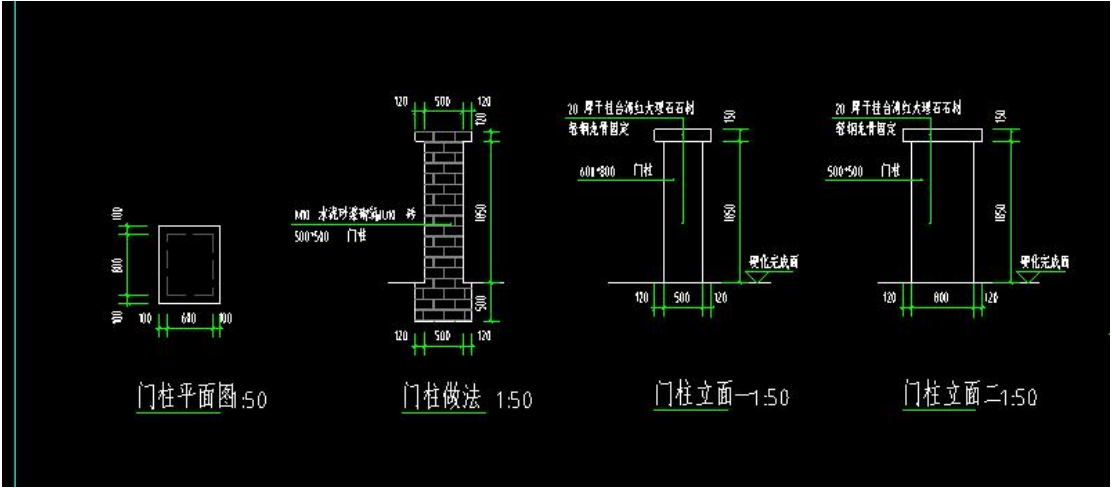

答：砖砌门柱断面为 500\*700，完成面 600\*800，龙骨为镀锌角钢 40\*3@600

2. 问：土方开挖的工程量中包含围墙基础及地梁的挖土方吗？

主要工程量表				
项目	工程量	单位	做法	备注
混凝土硬化	2080	m <sup>2</sup>	见详图	
围墙	267	m	见详图	
电动格栅道闸	2	樘	见详图	1200*2800
门柱	2	个	见详图	
停车位画线	10	个	12 cm宽热熔白色丙烯酸标线	3m*6m
拆除既有轻钢结构房屋	225	m <sup>2</sup>	层高3.0m	
土方开挖外运	1365	m <sup>3</sup>	外运10 km	

答：土方开挖为场坪土方，不包括基础及地梁土方。

3. 问：室外围墙的地梁及柱的钢筋连接方式，是 16 以上的采用机械





答：标号 C30    140mm 厚

7. 问：不锈钢可揭式上人盖板规格型号厚度？

答：成品盖板，不锈钢厚度 3mm，框格龙骨镀锌角钢 50\*5@400

8. 问：女儿墙是否为 240mm 标准砖砌筑？是的话砌筑砂浆标号是多少？

答：砖砌女儿墙，M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖

9. 问：图纸做法雨水管采用 1.2mm 厚  $\Phi 100$  不锈钢雨水管，图集做法见:12J5-1-E2-10，这个是镀锌钢板雨水管，最终参考图集做法可以不？

答：材质为不锈钢雨水管，安装做法参考图集

10. 问：定制烤漆发光字是什么材质的？

答：亚克力



宏骏勘察设计有限公司

2025 年 8 月 8 日
